

Modelo D.I.C.E.¹ – Os Quatro Fatores Chave da Gestão da Mudança

Na visão de Sirkin, Keenan e Jackson (2005), está faltando no gerenciamento de mudanças um foco nos aspectos que geralmente não são tão atraentes na Gestão da Mudança: os fatores *hard*. Tais aspectos consideram três características: as empresas são capazes de medi-los, as empresas podem facilmente comunicar sua importância, e é possível influenciar esses elementos de forma rápida. Alguns dos fatores *hard* que afetam uma iniciativa de transformação são: o tempo necessário para completá-la, o número de pessoas necessárias para executá-la, e os resultados financeiros esperados com as ações propostas. De acordo com os autores, projetos de mudança fracassam quando as organizações negligenciam os aspectos *hard* da mudança. Se as organizações não prestarem atenção a essas questões *hard*, os programas de transformação irão desabar mesmo antes dos elementos *soft* entrarem em cena.

A pesquisa realizada por Sirkin, Keenan e Jackson (2005) revelou que existe uma correlação consistente entre os resultados de sucesso ou fracasso de projetos de mudança com quatro aspectos *hard* existentes em um projeto: **duração** do projeto, particularmente o tempo entre as revisões (avaliações) do projeto; **integridade** relacionada ao desempenho ou capacidade (competência) do time de projeto para a execução do projeto; o **comprometimento** tanto do time da alta gestão quanto dos demais membros da organização que afetam ou serão afetados pela mudança; e o **esforço** adicional que os colaboradores terão que fazer para lidar com a mudança. Os autores nomearam esses fatores com o acrônimo DICE (dados para jogos) porque eles poderiam ser ‘lançados’ em favor do projeto, fazendo analogia aos jogos de azar. Os quatro fatores DICE podem ser mais bem explicados pelo Quadro 01.

Quadro 01 – Os Quatro Fatores D.I.C.E. (Duração, Integridade, Comprometimento, Esforço)

Duração (<i>Duration</i>)	O tempo percorrido até que a mudança seja finalizada em caso de projeto com tempo curto, ou então o espaço de tempo entre revisões dos marcos do projeto.
Integridade (<i>Integrity</i>) (Competência da Equipe)	A integridade do time de projeto relacionada ao seu desempenho, que é a habilidade do time em completar a atividade no tempo. Isso depende das competências dos membros do time e características relativas aos requisitos do projeto.
Comprometimento (<i>Commitment</i>)	O comprometimento demonstrado com relação à mudança tanto pelos representantes da alta administração (C ₁) quanto dos demais colaboradores afetados com a mudança (C ₂).
Esforço (<i>Effort</i>)	O nível de esforço que deverá empreendido além das tarefas usuais das pessoas que as iniciativas de mudança irão demandar dos participantes, diretamente ou indiretamente envolvidos com o projeto.

Fonte: adaptado de Sirkin, Keenan e Jackson (2005).

¹ Fonte: Sirkin, H. L.; Keenan, P.; Jackson, A. The Hard Side of Change Management, *Harvard Business Review*, October, 2005

É possível determinar se as chances de sucesso de um projeto são altas ou baixas perguntando aos executivos as suas percepções quanto à avaliação de cada um dos fatores DICE. Eles devem, para isso, pontuar cada fator em uma escala que vai de 1 (muito bom) a 4 (muito ruim), usando frações se quiserem. Assim, a pontuação menor (1) significa que aquele fator em específico está contribuindo com a probabilidade de sucesso do projeto; e a pontuação mais alta (4) representa que aquele fator não está contribuindo com o sucesso, pelo contrário, é um indício de fracasso do projeto.

O Quadro 02 apresenta algumas sugestões de pontuação para as questões que podem servir como diretrizes para os executivos fazerem suas próprias avaliações dos projetos dos quais participam ou apoiam.

Quadro 02 – Cálculo da Pontuação D.I.C.E.

D	A equipe costuma fazer acompanhamento e revisões do projeto de forma regular. As revisões acontecem numa frequência coerente com o tempo total do projeto (por exemplo de 2 em 2 meses). (Pontuação: concordo totalmente = 1; concordo = 2; discordo = 3; discordo totalmente = 4)
I	A liderança da equipe tem se mostrado capaz de garantir a realização do projeto. Os membros da equipe possuem competência adequada para concluir a iniciativa de mudança no prazo. (Pontuação: concordo totalmente = 1; concordo = 2; discordo = 3; discordo totalmente = 4)
C₁	A alta liderança comunica com frequência a razão da mudança e a importância do sucesso. A mensagem é consistente e convincente. A alta liderança tem direcionado recursos suficientes para a mudança. (Pontuação: concordo totalmente = 1; concordo = 2; discordo = 3; discordo totalmente = 4)
C₂	Os colaboradores que impactam ou são impactados pela mudança entendem as razões e acreditam na necessidade da transformação. Eles dão apoio e estão motivados. Não estão aflitos nem demonstrando sinais de resistência. (Pontuação: concordo totalmente = 1; concordo = 2; discordo = 3; discordo totalmente = 4)
E	O projeto demanda uma quantidade de esforço compatível com as atividades do dia-a-dia dos membros da equipe. A equipe prioriza seu tempo para empregar o esforço na mudança. Não se percebe resistência quando necessário aumentar o esforço demandado para a equipe. (Pontuação: concordo totalmente = 1; concordo = 2; discordo = 3; discordo totalmente = 4)

Fonte: adaptado de Sirkin, Keenan e Jackson (2005, p. 109).

Quando os pesquisadores realizaram uma análise de regressão com dados de 225 projetos de mudança, dos quais eles tiveram acesso à avaliação de sucesso ou insucesso e aplicaram a pontuação DICE, eles encontraram uma correlação ainda mais forte de dois fatores específicos do modelo que dobram o peso no cálculo da probabilidade de sucesso do projeto: a competência ou integridade (I) das pessoas e o comprometimento do time da alta gestão (C₁) para com o projeto (SIRKIN; KEENAN; JACKSON, 2005). Assim a equação para o cálculo da pontuação DICE é a seguinte:


$$DICE\ Score = D + (2 \times I) + (2 \times C_1) + C_2 + E$$

A análise de regressão do modelo também mostrou que (SIRKIN; KEENAN; JACKSON, 2005):

- **Pontuações entre 7 e 14** → O projeto possui alta probabilidade de sucesso, conhecido como a zona da vitória.
- **Pontuações entre 14 e 17** → Os riscos para o projeto estão aumentando, principalmente quando a pontuação se aproxima do número 17. Essa é a zona de preocupação.
- **Pontuações acima de 17** → O projeto possui alto risco de insucesso. Pontuações entre 17 e 19 indicam um risco de insucesso muito alto. Pontuações acima de 19 indicam que o projeto irá provavelmente fracassar. Essa é a zona das dificuldades.

Uma forma de gerenciar o andamento do projeto é seguir o procedimento indicado anteriormente para se calcular a pontuação DICE em um determinado momento do projeto e inserir o resultado na Figura 01. Essa mesma figura pode ser usada para avaliar outros momentos do projeto e acompanhar sua evolução quanto aos pontos dos fatores DICE e qual a probabilidade de sucesso ou insucesso do projeto nesses momentos em específico.

Figura 01 – Modelo D.I.C.E.

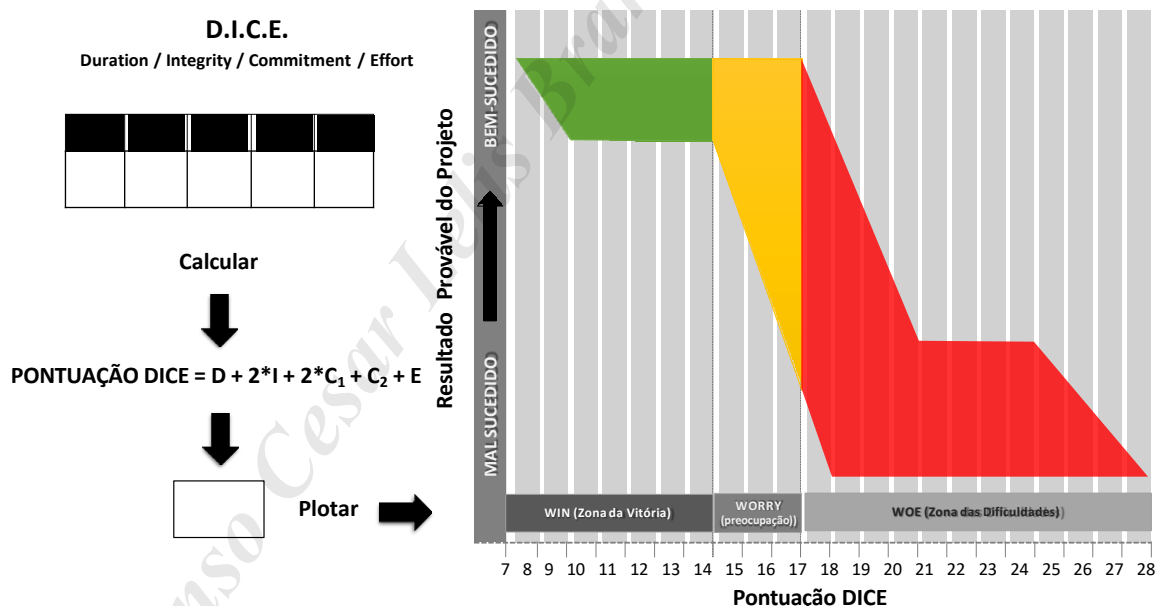

Fonte: Sirkin, Keenan e Jackson (2005, p. 110).


Por meio dessa pontuação DICE, as empresas podem avaliar como os projetos de mudança estão progredindo ao longo do tempo; também podem avaliar os projetos antes e/ou depois de terem feito mudanças em sua estrutura. Os quatro fatores funcionam como um exame que os executivos podem fazer para avaliar a probabilidade de sucesso para um dado projeto ou para um conjunto de projetos (SIRKIN; KEENAN; JACKSON, 2005).

Embora as avaliações sejam subjetivas, a ferramenta oferece à organização uma estrutura objetiva para a tomada de decisão. Além disso, o mecanismo de pontuação garante que o time executivo está avaliando os projetos em seus momentos importantes ou marcos e considerando também os possíveis *trade-offs* existentes entre diferentes projetos (SIRKIN; KEENAN; JACKSON, 2005).

No geral, de acordo com os autores, o modelo DICE pode ser usado para três finalidades (SIRKIN; KEENAN; JACKSON, 2005):

1. **Avaliar os projetos ao longo do tempo** – os executivos podem usar alguma ferramenta específica como uma planilha eletrônica para registrar todas as pontuações e suas diferentes versões em momentos diferentes do projeto e comparar a evolução com base nos dados passados (ver um exemplo na Figura 02).
2. **Gerenciar o portfólio de projetos** – as empresas podem identificar projetos que estão apresentando problemas e então focar a expertise dos times de execução e a atenção da alta gestão onde é mais necessário naquele determinado momento, o que envolve também desarmar questões políticas que possam existir.
3. **Forçar conversações sobre os projetos** – algumas questões interessantes que podem ser postas à mesa: “por que nós vemos o projeto de formas diferentes?” ou “quais são nossos pontos de concordância quanto a garantir que o projeto irá ser bem sucedido?”.

Figura 02 – Exemplo de Gestão D.I.C.E. para um Projeto Específico

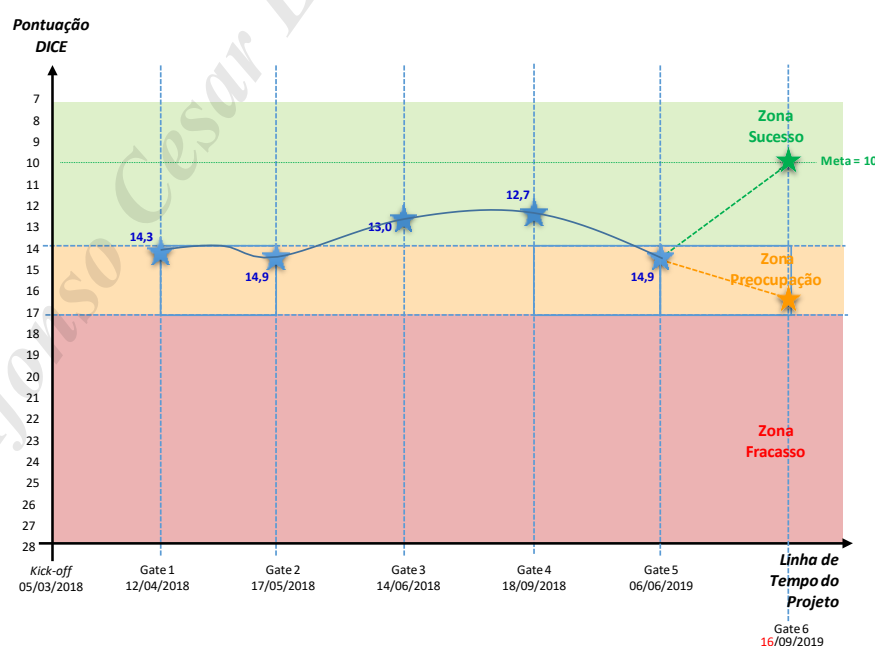

Fonte: baseado em projeto de pesquisa do Grupo de Gestão da Mudança, EESC-USP.
