

DICE MODEL¹

O **DICE** é uma ferramenta que permite a previsão e manipulação de resultados do projeto com base em uma fórmula simples derivada do nosso estudo de centenas de grandes programas de mudanças em empresas de todo o mundo. Quando as cinco variáveis são usadas em conjunto, é obtida uma previsão mais precisa sobre a probabilidade de sucesso do projeto. Para obter um escore DICE para sua própria iniciativa, use as opções abaixo para avaliar cada um dos elementos do DICE.

O **DICE** foi desenvolvido pela BCG, sendo uma análise de regressão múltipla e complexa utilizando quatro elementos principais:

- **Duração (D):** tempo necessário para concluir um projeto, ou o intervalo entre os principais "marcos de aprendizagem" se um projeto durar 6 meses ou mais.
- **Integridade (I):** integridade do desempenho da equipe do projeto. Abrange as principais habilidades e os traços gerais da equipe, e como ela foi configurada.
- **Compromisso (C):** compromisso de mudança mostrado pela gerência seniores (**C1**) e as pessoas que estão passando pela mudança (**C2**).
- **Esforço (E):** o esforço local adicional acima dos requisitos normais de trabalho necessários durante a implementação. Isso se relaciona com o esforço daqueles submetidos à mudança, em oposição à equipe do projeto que lidera o programa de mudanças.

Instruções: para cada uma das questões abaixo, selecione a alternativa que mais se aproxima do contexto atual do projeto, envolvendo os quatro elementos do DICE. Na sequência, você terá acesso ao gabarito das questões, e deverá calcular a soma do escore DICE. O resultado final poderá ser visualizado no Gráfico DICE, e você também terá acesso a recomendações sobre próximos passos, visando o sucesso de sua iniciativa.

Respostas:

Nome da Iniciativa / Projeto de Transformação

Selecione a alternativa que mais se assemelha ao contexto de sua iniciativa / projeto:

D. Duração entre marcos de aprendizagem ou até conclusão	Alternativa	Pontuação
< 2 meses	A	1
2 a 4 meses	B	2
4 a 8 meses	C	3
> 8 meses	D	4

¹ Fonte: Sirkin, H. L.; Keenan, P.; Jackson, A. The Hard Side of Change Management, *Harvard Business Review*, October, 2005

I. Integridade do desempenho da equipe	Alternativa	Pontuação
Muito boa	A	1
Boa	B	2
Média	C	3
Baixa / fraca	D	4

C1. Compromisso da alta gestão (time sênior)	Alternativa	Pontuação
Muito forte. Comunicam a importância do projeto constantemente.	A	1
Parecem querer o sucesso do projeto	B	2
Compromisso neutro.	C	3
Relutantes com o projeto.	D	4

C2. Compromisso das pessoas que estão passando pela mudança	Alternativa	Pontuação
Ansiosos com o projeto	A	1
Dispostos a contribuir com o projeto	B	2
Relutantes com o projeto	C	3
Fortemente relutantes com o projeto	D	4

E. Esforço adicional das pessoas que estão passando pela mudança	Alternativa	Pontuação
< 10% de esforço adicional	A	1
10% a 20% de esforço adicional	B	2
20% a 40% de esforço adicional	C	3
> 40% de esforço adicional	D	4

Pontuação:

A avaliação do alinhamento organizacional é muito fácil. A fórmula de cálculo está logo abaixo. Não esqueça de multiplicar por “2” os critérios “I – Integridade” e “C1 – Compromisso da alta gestão”.


Questão	D	I	C1	C2	E
Resultado					

$$\text{Pontuação Geral} = D + 2 I + 2 C1 + C2 + E$$

$$\text{Pontuação Geral} = (\quad) + 2 (\quad) + 2 (\quad) + (\quad) + (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Gráfico DICE

Use os resultados da pontuação geral para identificar a classificação da probabilidade de sucesso de sua iniciativa / projeto no Gráfico DICE abaixo.

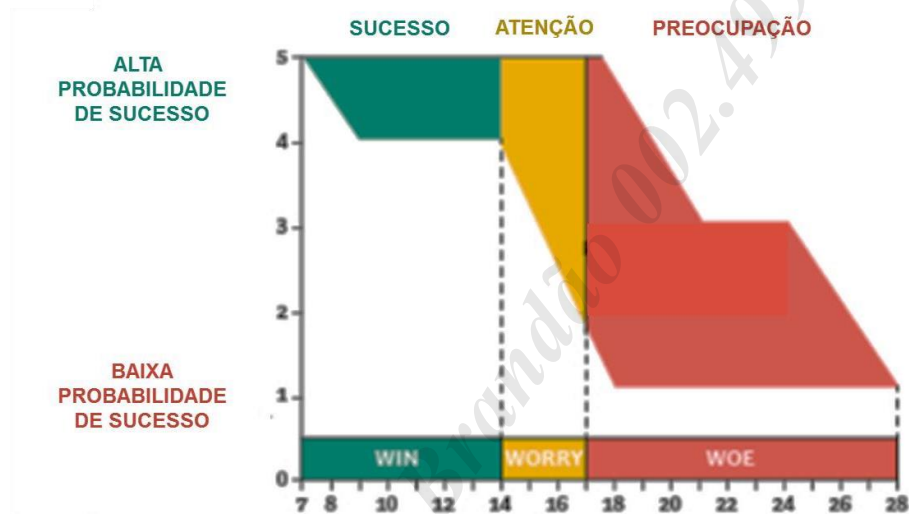

Recomendações

Resultado	Recomendação
WIN (verde)	Esta iniciativa é muito provável para ter sucesso. Considere, no entanto, se o esforço pode ter muitos recursos ou poucas ambições. O escopo do roteiro deve ser revisado? Os recursos principais são melhorados em outros lugares?
WORRY (amarelo)	Esta iniciativa não está estruturada para o sucesso. O resultado final provavelmente será abaixo do esperado. Enquanto o esforço provavelmente fornecerá algum valor, também pode deixar de cumprir objetivos. Faça ações para reduzir o escore DICE para 13 ou abaixo.
WOE (vermelho)	O resultado é inesperado ou a iniciativa está estruturada para falhar. Não realize esta iniciativa, a menos que ações corretivas definitivas possam ser tomadas para reduzir significativamente a pontuação DICE para 13 ou abaixo.

Linhas de Ação

Pontuação DICE	Diagnóstico	Linhas de Ação
De 7 a 13 <i>WIN</i> (verde)	Projeto com alta probabilidade de sucesso.	Manter a gestão do projeto como está.
De 14 a 17 <i>WORRY</i> (amarelo)	Projeto em zona de preocupação, sem a certeza se será bem sucedido ou se tende a fracassar.	Identificar cada um dos fatores DICE e definir linhas de conduta para melhorias da nota individual por fator e global na próxima avaliação de progresso do projeto.
De 18 a 28 <i>WOE</i> (vermelho)	Projeto com alta probabilidade de fracasso, principalmente para pontuações maiores do que 20.	- Decidir se projeto deve ser interrompido ou cancelado. - Investir em cada um dos fatores DICE e definir linhas de conduta para melhorias substanciais das notas individuais dos fatores e da nota global na próxima avaliação de progresso do projeto.

Tarefa

- Aplique o DICE em uma situação real de projeto que você vive ou vivenciou.
- Descreva o projeto (objetivo, escopo, prazo e momento atual do projeto).
- Justifique suas notas dadas para cada fator DICE.
- Classifique o projeto nas zonas *win*, *worry*, *woe*, e em função dessa classificação defina planos de ação para melhor cada fator em avaliações futuras. Descreva os planos de ação.
